

Herzlich Willkommen



Außerordentliche Mitgliederversammlung 27. September 2013

Tagesordnung

1. **Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden**
2. Bericht zum Sachstand „Neubau Feuerwehrgerätehaus“
3. Bericht zum Sachstand „Ausschreibung TSF-W“
4. Beschaffung VW-Bus als Mehrzweckfahrzeug durch den Feuerwehrverein
5. Grußworte
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Begrüßung

- Mitglieder
- Ehrenmitglied Altbürgermeister Anton Kütt
- 1. Bürgermeister Burkard Losert
- Marktgemeinderätinnen & -räte
- Roland Stuis, Bauleitung Feuerwehrhaus
- KBR Geißler
- KBI Reitzenstein
- KBM Groschup
- FF Rimpar, Kommandant Eschenbacher

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht zum Sachstand „Neubau Feuerwehrgerätehaus“
3. Bericht zum Sachstand „Ausschreibung TSF-W“
4. Beschaffung VW-Bus als Mehrzweckfahrzeug durch den Feuerwehrverein
5. Grußworte
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Feuerwehrgerätehaus

Info der Generalversammlung am 25.01.2013

Februar 2012	Notarielle Überschreibung des Grundstückes Retzstadter Straße 4 an den Markt Rimpar zum Bau eines Feuerwehrhauses
Februar / März 2012	Vorplanung des Gerätehauses durch das Feuerwehr-Planungsteam
22.3.12	Vorstellung der Vorplanung im Bauausschuss des Marktes Rimpar
April 2012	Start der Spendenaktion mit großem Erfolg. Vielen Dank an alle Spender!
bis Juni 2012	Zeichnung der Baueingabepläne durch Maurermeister Dieter Wagenbrenner
Juni 2012	Besichtigung / Begehung einer Stahlbauhalle in Veitshöchheim und des Grundstückes in Gramschatz Bestätigung der Planung durch den Bauausschuss des Marktes Rimpar
Juni / Juli 2012	Ausräumen und Abbruch der Gebäude in Eigenleistung und Abbruchfirma
Juli / August 2012	Neue Dachrinne für das Nachbarsanwesen, wg. Grundstücksbegradigung
August 2012	Beauftragung von Architekt Claus Arnold mit der Baueingabeplanung, Werkplanung und Ausschreibung
24.9.12	Einreichung des Bauantrags an das Landratsamt Würzburg
Oktober – Dezember	Nachreichung der vom Landratsamt geforderten Unterlagen
3. KW 2013	Baugenehmigung durch das Landratsamt Würzburg Förderantrag an die Regierung von Unterfranken
April 2013	erhoffter spätestester Baubeginn - leider nicht

Feuerwehrgerätehaus

- Februar 2013 Besprechungen Vorstandschaft / Planungsteam:
Förderantrag ist bei Fr. Schnell, Reg. V. Ufr.
- April 2013 Besprechungen Vorstandschaft / Planungsteam
- Besprechung** mit **Architekt** wegen **Durchführung der Eigenleistungen**
und welche Arbeiten ausgeschrieben werden.
- Besprechung der Elektroinstallation mit Martin Lamprecht.
- Sanitär- und Heizungsplanung durch Elmar Rottmann
12. April 2013 Förderbescheid von Regierung von Unterfranken
2. Mai 2013 Werkpläne von Architekt Claus Arnold
3. Mai 2013 **Besprechung bei Claus Arnold mit Metallbau Röder u. Planungsteam**
Technische Ausführung ist geklärt (Innenwände bis zur Decke in F90,
zu beiden Seiten, alle in F90 ausgeführten Teile können nicht in
Eigenleistung aufgebaut werden. Durch die Brandschutzwand können die
Decken ohne Vorgaben in Eigenleistung gebaut werden.
- Außenfarbe Verkehrsweiß, Fenster, Türen und Tore in Grau
ähnlich RAL 9006.
- Halle wird voraussichtlich teurer als Infoangebot, wegen der Ausführung
in F90 von Wand und Decke (über der Fahrzeughalle)
- Mitte Mai 2013 Roland Stuis wird zur Bauleitung beauftragt
- Mai/Juni 2013 **Ausschreibung und Auftragsvergabe für Tiefbau und Stahlbau**

Feuerwehrgerätehaus

26. Juni 2013	Baubeginn mit Planierung des Grundstücks, Baustelleneinrichtung
Juli 2013	Fundamente, Zuleitungen für Wasser, Abwasser, Strom und Telefon Bodenplatte der Nebenräume, Umkleide, Werkstatt, Schulungsraum, Toiletten und Büro
31. Juli 2013	Besprechung zur Freigabe der Stahlbaupläne und Zeitplanung
August 2013	Bau der Gabionenwand in Eigenleistung (rd. 300 Arbeitsstunden)

Aktueller Zeitplan (4. September 2013)

KW 36/37: 2. – 13.9.13	Hydrant und Hausanschlussschacht anschließen und verfüllen (Lurz/Göbel)
KW 38/39: 16. – 27.9.13	Fertigstellen und Verfüllen der Gabionen, links der Hofeinfahrt, bei Hausanschlussschacht (Eigenleistung)
KW 40: 30.9. – 4.10.13	Widerlager Halle (Metallbau Röder)
KW 41: 7. – 11.10.13	Sockel betonieren, Rinne, Einläufe, Randsteine setzen (Göbel)
KW 42/43: 14. – 25.10.13	Wand & Dach stellen (Metallbau Röder)
KW 44: 28.10. – 31.10.13	Bodenplatte, Sole Fahrzeughalle (Göbel)
KW 45: 4. – 8.11.13	Pflasterarbeiten Hof (Eigenleistung)
Anschl.	Estrich / Fließen Elektroinstallation Heizung/Sanitär Innenausbau (Eigenleistung)

Feuerwehrgerätehaus



Feuerwehrrgerätehaus




Feuerwehrgerätehaus



Foto: Wiscopter - Thomas Wetzel, Gramschatz

Feuerwehrrgerätehaus

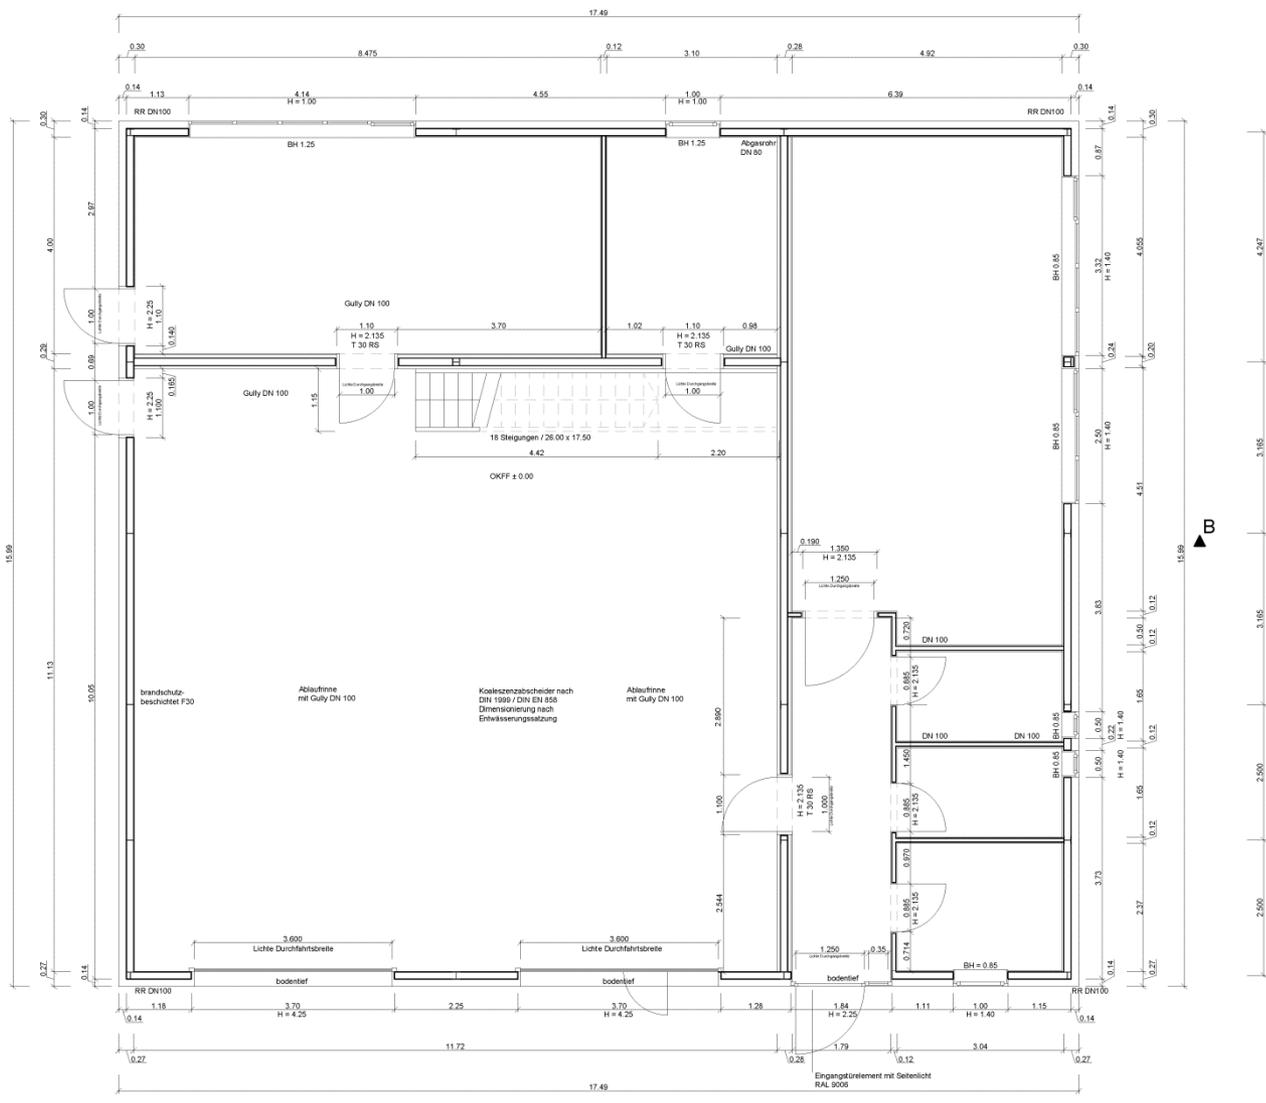

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht zum Sachstand „Neubau Feuerwehrgerätehaus“
3. Bericht zum Sachstand „Ausschreibung TSF-W“
4. Beschaffung VW-Bus als Mehrzweckfahrzeug durch den Feuerwehrverein
5. Grußworte
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

TSF - W

Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser

- November 2012 Antrag zum Haushaltsplan 2013: Planung der Ersatzbeschaffung für das im Einsatz befindliche TSF, Baujahr 1984
21. Januar 2013 Besprechung des Interfraktioneller Ausschuss des Marktes Rimpar mit den Kommandanten der FF Rimpar und Gramschatz zur Planung der Fahrzeug - Ersatzbeschaffungen im Jahr 2013
- Januar/Februar 2013 Planungsgespräche innerhalb FF Gramschatz und zusammen mit FF Rimpar, 1. Kdt. Theo Eschenbacher und 2. Kdt. Markus Fleder
Idee der Kooperation mit FF Bad Kissingen (Sammelausschreibung)
- bis April 2013 Erstellung einer Leistungsbeschreibung TSF-W
Fahrgestell: Mercedes-Benz Vario 7,49 t. für TSF-W gut geeignet
Produktionsende 2013
- April 2013 Fahrzeugbesichtigung in Allersheim und Schwebenried
Info: Mercedes-Benz Vario nicht mehr bestellbar
- Mai 2013 Besprechung in Bad Kissingen mit dem SBI Harald Albert:
Übereinstimmende Vorstellungen von Fahrgestell und Aufbau.
- Bis Juli 2013 Erstellung einer Leistungsbeschreibung TSF-W,
Federführung durch SBI Harald Albert
(mögliche Fahrgestelle: Mercedes-Benz Atego, MAN TGL, Iveco, ... Aufbau in Vollaluminiumbauweise, Stecksystem, Tiefbau zwischen und nach der 2. Achse, Klappen als Auftritt)

TSF - W

Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser

22. Juli 2013 Beginn der europaweiten Ausschreibung in Kooperation des Marktes Rimpar, Stadt Bad Kissingen und Markt Burkardroth (vier TSF-W)
23. August 2013 Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder Einsichtnahme
- Alle namhaften Fahrgestellhersteller (z.B. Daimler AG, MAN, Iveco), Aufbauhersteller (z.B. Magirus, Schlingmann, Ziegler, Rosenbauer, Empl, ADIK) und Brandschutzfachhändler (Beladung z.B. Herbach, Schimpf, Handelsforum) haben die Unterlagen angefordert.
18. Oktober 2013, 9.00 Uhr Schlusstermin für den Eingang der Angebote
18. Oktober 2013, 10.00 Uhr Öffnung der Angebote

TSF – W (Beispiele)



TSF – W (Beispiele)



Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht zum Sachstand „Neubau Feuerwehrgerätehaus“
3. Bericht zum Sachstand „Ausschreibung TSF-W“
4. **Beschaffung VW-Bus als Mehrzweckfahrzeug durch den Feuerwehrverein**
5. Grußworte
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

VW-Bus als MZF oder MTW

Die Förderzusage der Regierung von Unterfranken für das neue Feuerwehr-Haus mit zwei Stellplätzen beinhaltet die Auflage, dass beide Stellplätze Innerhalb fünf Jahre belegt sein müssen.

Für die zunehmenden Fahrten zu Ausbildungen, Besprechungen, Versammlungen, Gerätwartung- und -pflege ist ein zweites Fahrzeug in zunehmenden Maß erforderlich.

März 2013	Idee der FF Gramschatz einen ausgemusterten Polizeibus (VW T4) als Mehrzweckfahrzeug bzw. Mannschaftstransportfahrzeug zu beschaffen Besichtigung eines umgebauten VW-Bus und Besprechung bei der FF Retzstadt
April 2013	Info durch Walter Riedmann (BF Würzburg/FF Rimpar) über den geplanten Verkauf eines VW-Bus T4 durch die BF Würzburg
Mai 2013	Kontaktaufnahme mit der BF Würzburg, Abteilungsleiter Technik, Hr. Lange Interessensbekundung durch FF Gramschatz Besprechung im Vorstand: Finanzierung durch Verein
21. August 2013	Besichtigung des VW- Bus in der BF geplanter Verkauf September/Oktober 2013
September 2013	Info an Markt Rimpar, Bgm. Burkard Losert Spendenschreiben an KFZ-Firmen → erste Zusagen

VW-Bus als MZF oder MTW



Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht zum Sachstand „Neubau Feuerwehrgerätehaus“
3. Bericht zum Sachstand „Ausschreibung TSF-W“
4. Beschaffung VW-Bus als Mehrzweckfahrzeug durch den Feuerwehrverein
5. **Grußworte**
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht zum Sachstand „Neubau Feuerwehrgerätehaus“
3. Bericht zum Sachstand „Ausschreibung TSF-W“
4. Beschaffung VW-Bus als Mehrzweckfahrzeug durch den Feuerwehrverein
5. Grußworte
6. **Sonstiges, Wünsche und Anträge**

Sonstiges, Wünsche und Anträge

- Herzlichen Dank an Bürgermeister und die Führungskräfte für die gute Unterstützung
- Herzlichen Dank allen Helfern beim Gerätehausbau, Planung TSF-W, Spendern
- Weitere Unterstützung bei weiteren Bau des Feuerwehrgerätehauses ist nötig

**Schön, dass ihr da
wart! Danke!**

**Vielen Dank
für Eure
Aufmerksamkeit !**
